

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
0	Plan de Travail des activités de Direction des Opérations	1623 days	Fri 15/01/16	Fri 12/08/22	
1	Activités transversales de la Direction des Opérations	1463 days	Mon 12/09/16	Fri 12/08/22	
2	Analyse des matières dangereuses (PCB et déchets d'hydrocarbure) y compris les TdR pour l'élimination des PCB et l'option contractuelle	380 days	Mon 12/09/16	Tue 27/03/18	
3	Lancement de l'appel d'offres	6 days	Mon 12/09/16	Mon 19/09/16	
4	Préparation, réception et ouverture des offres	60 days	Mon 24/10/16	Fri 20/01/17	3FS+23 days
5	Processus d'évaluation des offres/Propositions/Devis	50 days	Mon 23/01/17	Tue 04/04/17	4
6	Négociation et signature du contrat	43 days	Wed 05/04/17	Wed 07/06/17	5
7	Exécution du contrat	198 days	Thu 08/06/17	Tue 27/03/18	6
8	Environnemental, Social and Oversight Consultant (ESOC)	1229 days	Thu 24/08/17	Fri 12/08/22	
9	Lancement de l'appel d'offres	4 days	Thu 24/08/17	Tue 29/08/17	
10	Préparation, réception et ouverture des offres	42 days	Tue 29/08/17	Thu 26/10/17	9FS-1 day
11	Processus d'évaluation des offres/Propositions/Devis	40 days	Fri 27/10/17	Fri 22/12/17	10
12	Négociation et signature du contrat	26 days	Fri 22/12/17	Thu 01/02/18	11FS-1 day
13	Exécution du contrat	1119 days	Fri 02/02/18	Fri 12/08/22	
14	Livrables liés au Contrat	1119 days	Fri 02/02/18	Fri 12/08/22	
15	Plan de Travail	40 days	Fri 02/02/18	Mon 02/04/18	12
16	Plan de Gestion du Programme	80 days	Fri 02/02/18	Thu 31/05/18	12
17	1ere révision du SGESSS de MCA-Bénin II ainsi que les mises à jour annuelles du SGESSS, y compris tous les plans et procédures associés	60 days	Fri 02/02/18	Mon 30/04/18	12
18	Mise à jour du PEPP de MCA-Bénin (annuel)	70 days	Fri 02/02/18	Tue 15/05/18	12

Project: Plan de Travail des acti
Date: Tue 19/09/17

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
19	Les SGESSS de la SBEE et de la CEB, y compris tous les plans et procédures associés	140 days	Fri 02/02/18	Wed 29/08/18	12
20	Le PEPP de la SBEE et de la CEB	140 days	Fri 02/02/18	Wed 29/08/18	12
21	Plan de Contrôle Qualité	150 days	Fri 02/02/18	Thu 13/09/18	12
22	Plan de Contrôle du Programme	170 days	Fri 02/02/18	Fri 12/10/18	12
23	Revue du projet d'Appel à Proposition et du Rapport de lancement des réinstallations	0 days	Fri 02/03/18	Fri 02/03/18	19SS+20 days
24	Les rapports d'EIES/PGES programmatiques et les spécifications techniques pour les quatre sites solaires PV	130 days	Fri 02/02/18	Tue 14/08/18	12
25	Les PAR provisoires incluant l'étude des montants de compensation, le programme d'assistance aux personnes vulnérables, le programme de restauration des moyens de subsistance et le programme de gestion des flux, pour les activités de production solaire et	140 days	Fri 02/02/18	Wed 29/08/18	12
26	Ébauche de PAR, incluant l'étude des montants de compensation, le programme d'assistance aux personnes vulnérables, le programme de restauration des moyens de subsistance et le programme de gestion des flux, pour les activités de renforcement du réseau de	180 days	Fri 02/02/18	Fri 26/10/18	12
27	Elaboration de divers comptes rendus et rapports contractuels	1119 days	Fri 02/02/18	Fri 12/08/22	12
28	Activités des Projets de la Direction des Opérations	1588 days?	Fri 15/01/16	Tue 21/06/22	
29	Projet "Réforme des Politiques et Renforcement des Institutions"	1583 days	Mon 25/01/16	Tue 21/06/22	
30	Activité d'Appui à la réforme des Politiques, de la Régulation et des Institutions	1583 days	Mon 25/01/16	Tue 21/06/22	
31	Sous-activité Régulation et Tarifs	1583 days	Mon 25/01/16	Tue 21/06/22	
32	Appui à l'Autorité de Régulation	1105 days	Tue 02/01/18	Tue 21/06/22	

Project: Plan de Travail des acti
Date: Tue 19/09/17

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
33	Etude tarifaire	517 days	Mon 25/01/16	Wed 28/02/18	
34	Lancement de la demande de Propositions	5 days	Mon 25/01/16	Fri 29/01/16	
35	Préparation, réception et ouverture des offres	37 days	Mon 01/02/16	Wed 23/03/16	34
36	Processus d'évaluation des offres/Propositions/Devis	76 days	Thu 24/03/16	Fri 15/07/16	35
37	Négociation et signature du contrat	45 days	Mon 18/07/16	Wed 21/09/16	36
38	Exécution de la mission	354 days	Thu 22/09/16	Wed 28/02/18	37
39	Etude GENCO	387 days	Mon 21/03/16	Mon 16/10/17	
40	Lancement de la demande de Propositions	3 days	Mon 21/03/16	Wed 23/03/16	
41	Préparation, réception et ouverture des offres	40 days	Thu 24/03/16	Mon 23/05/16	40
42	Processus d'évaluation des offres/Propositions/Devis	98 days	Tue 24/05/16	Mon 17/10/16	41
43	Négociation et signature du contrat	28 days	Tue 18/10/16	Mon 28/11/16	42
44	Exécution de la mission	203 days	Tue 20/12/16	Mon 16/10/17	43FS+15 days
45	Sous-Activité production Indépendante d'Electricité	396 days	Mon 10/07/17	Tue 19/02/19	
46	Lancement de l'Appel d'offres	4 days	Mon 10/07/17	Thu 13/07/17	
47	Préparation, réception et ouverture des offres	42 days	Fri 14/07/17	Thu 14/09/17	46
48	Processus d'évaluation des offres/Propositions/Devis	40 days	Fri 15/09/17	Fri 10/11/17	47
49	Négociation et signature du contrat	25 days	Mon 13/11/17	Fri 15/12/17	48
50	Exécution de la mission	285 days	Mon 18/12/17	Tue 19/02/19	
51	Base period services	90 days	Mon 18/12/17	Mon 30/04/18	
52	Inception report	25 days	Mon 18/12/17	Thu 25/01/18	49
53	Legal memorandum	60 days	Mon 18/12/17	Fri 16/03/18	49
54	Framework, risk analysis and draft agreements	70 days	Mon 18/12/17	Mon 02/04/18	49

Project: Plan de Travail des acti
Date: Tue 19/09/17

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
55	Tariff, Credit Support, Financial Model and User Manual	80 days	Mon 18/12/17	Mon 16/04/18	49
56	Solicitation Process	85 days	Mon 18/12/17	Mon 23/04/18	49
57	Closeout Report	90 days	Mon 18/12/17	Mon 30/04/18	49
58	Option 1: technical and Environmental and Social requirements	120 days	Mon 18/12/17	Thu 14/06/18	49
59	Option 2: Grid Stability	100 days	Mon 18/12/17	Tue 15/05/18	49
60	Option 3: Transaction advisor through commercial Close (Solar PV IPP)	260 days	Mon 18/12/17	Fri 11/01/19	49
61	Option 4: Transaction Advisor through Financial Close	25 days	Mon 14/01/19	Tue 19/02/19	60
62	Projet Production d'Electricité	1034 days	Thu 10/08/17	Wed 13/10/21	
63	Activité Production Photovoltaïque	1034 days	Thu 10/08/17	Wed 13/10/21	
64	Levé topographique des sites	112 days	Thu 10/08/17	Tue 23/01/18	
65	Lancement de la demande de Propositions	3 days	Thu 10/08/17	Mon 14/08/17	
66	Préparation, réception et ouverture des offres	30 days	Wed 16/08/17	Tue 26/09/17	65
67	Processus d'évaluation des offres/Propositions/Devis	8 days	Wed 27/09/17	Fri 06/10/17	66
68	Négociation et signature du contrat	11 days	Mon 09/10/17	Tue 24/10/17	67
69	Réalisation des levés topographiques	60 days	Wed 25/10/17	Tue 23/01/18	
70	Plan de travail, calendrier de mise en œuvre et méthodologie	5 days	Wed 25/10/17	Tue 31/10/17	68
71	Tous les documents sur les sites	60 days	Wed 25/10/17	Tue 23/01/18	68
72	Appel d'offres pour Producteurs Indépendants d'Electricité (Plan A)	360 days	Wed 20/02/19	Tue 04/08/20	61
73	Construction (Plan A)	300 days	Wed 05/08/20	Wed 13/10/21	
74	Nattingou (5MW)	300 days	Wed 05/08/20	Wed 13/10/21	72
75	Djougou (10 MW)	300 days	Wed 05/08/20	Wed 13/10/21	72
76	Parakou (15 MW)	300 days	Wed 05/08/20	Wed 13/10/21	72

Project: Plan de Travail des acti
Date: Tue 19/09/17

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
77	Bohicon (15 MW)	300 days	Wed 05/08/20	Wed 13/10/21	72
78	Etudes de conception et d'ingenierie détaillée + EIES pour la construction des centrales solaires photovoltaïques (Plan B)	360 days	Fri 22/12/17	Fri 14/06/19	
79	Appel d'offres pour la sélection des entreprises en vue de la construction des centrales solaires photovoltaïques (Plan B)	126 days	Mon 17/06/19	Thu 19/12/19	78
80	Constructions (Plan B)	300 days	Fri 20/12/19	Thu 04/03/21	
81	Nattingou (5MW)	300 days	Fri 20/12/19	Thu 04/03/21	79
82	Djougou (10 MW)	300 days	Fri 20/12/19	Thu 04/03/21	79
83	Parakou (15 MW)	300 days	Fri 20/12/19	Thu 04/03/21	79
84	Bohicon (15 MW)	300 days	Fri 20/12/19	Thu 04/03/21	79
85	Activité production Hydroélectrique	675 days	Mon 16/04/18	Mon 11/01/21	
86	Etude de conception et Réalisation des travaux de Réhabilitation de Renforcement et Modernisation de la centrale hydro-électrique de Yeripao (Design-Buil+EIES+Etudes hydrologiques du barrage)	675 days	Mon 16/04/18	Mon 11/01/21	
87	Appel d'offres pour le recrutement de l'entreprise	121 days	Mon 16/04/18	Fri 12/10/18	
88	Etudes de conception et d'ingenierie détaillée + EIES	120 days	Thu 03/01/19	Mon 01/07/19	87FS+54 days
89	Travaux de réhabilitation/renforcement et modernisation du barrage hydroélectrique	380 days	Tue 02/07/19	Mon 11/01/21	88
90	Projet Distribution d'Electricité	1501 days?	Tue 24/05/16	Tue 21/06/22	
91	Activités "Préparation des plans de conception pour Cotonou et pour le Réseau au niveau Régional"	1191 days	Tue 24/05/16	Thu 25/03/21	
92	Appel d'offres pour le recrutement de consultants	448 days	Tue 24/05/16	Mon 19/03/18	
93	Lancement de la demande de Propositions	2 days	Tue 24/05/16	Wed 25/05/16	

Project: Plan de Travail des acti
Date: Tue 19/09/17

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
94	Préparation, réception et ouverture des offres	79 days	Thu 26/05/16	Wed 21/09/16	93
95	Processus d'évaluation des offres/Propositions/Devis	97 days	Thu 22/09/16	Mon 13/02/17	94
96	Négociation et signature du contrat	40 days	Mon 13/02/17	Tue 11/04/17	95FS-1 day
97	Exécution du contrat	221 days	Wed 26/04/17	Mon 19/03/18	
98	Préparation des documents relatifs aux travaux de construction- Activité Renforcement du Réseau au niveau Régional	220 days	Wed 26/04/17	Fri 16/03/18	96FS+10 days
99	Préparation des documents relatifs aux travaux de construction- Activité Renforcement du Réseade Cotonou	221 days	Wed 26/04/17	Mon 19/03/18	96FS+10 days
100	Travaux de renforcement du réseau au niveau régional	494 days	Tue 20/03/18	Thu 26/03/20	99
101	Travaux de renforcement du réseau de Cotonou	743 days	Tue 20/03/18	Thu 25/03/21	99
102	Program Management Consultant (PMC)	1209 days?	Wed 02/08/17	Tue 21/06/22	
103	Lancement de la demande de Propositions	3 days	Wed 02/08/17	Fri 04/08/17	
104	Préparation, réception et ouverture des offres	41 days	Mon 07/08/17	Tue 03/10/17	103
105	Processus d'évaluation des offres/Propositions/Devis	40 days	Wed 04/10/17	Thu 30/11/17	104
106	Négociation et signature du contrat	25 days	Fri 01/12/17	Mon 08/01/18	105
107	Exécution de la mission du PMC	1100 days?	Tue 09/01/18	Tue 21/06/22	106
108	Plan de travail	40 days	Tue 09/01/18	Thu 08/03/18	106
109	Plan de gestion du Programme	80 days	Tue 09/01/18	Mon 07/05/18	106
110	Plan de Contrôle de Qualité	1 day?	Tue 09/01/18	Tue 09/01/18	106
111	Plan des Contrôles du Programme	1 day?	Tue 09/01/18	Tue 09/01/18	106
112	Examen des dossiers d'appel d'offres et observations	1 day?	Tue 09/01/18	Tue 09/01/18	106
113	Examen des soumissions relatives aux conceptions/constructions	1 day?	Tue 09/01/18	Tue 09/01/18	106

Project: Plan de Travail des acti
Date: Tue 19/09/17

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
114	Rapports mensuels de progrès	1088 days	Mon 29/01/18	Tue 21/06/22	106FS+12 days
115	Rapports trimestriels de progrès	1028 days	Wed 25/04/18	Tue 21/06/22	106FS+72 days
116	Rapport annuel de performance	855 days	Fri 11/01/19	Tue 21/06/22	106FS+245 days
117	Rapport Final	1100 days	Tue 09/01/18	Tue 21/06/22	106
118	Procès-verbaux de réunion	1100 days	Tue 09/01/18	Tue 21/06/22	106
119	Activité Dispatching d'Electricité au plan National	1073 days	Thu 23/11/17	Fri 25/03/22	
120	Construction des batiments devant abriter le Dispatch Center (Centre principal et Centre de repli) -Design Build	486 days	Wed 29/11/17	Tue 26/11/19	
121	Appel d'offres pour le recrutement des entreprises	126 days	Wed 29/11/17	Tue 05/06/18	
122	Travaux de conception	120 days	Wed 06/06/18	Thu 29/11/18	121
123	Construction des bâtiments du Dispatching	240 days	Fri 30/11/18	Tue 26/11/19	122
124	Conception et réalisation du Centre National de Conduite (Dispatching) de la SBEE (Design & Build-IT)	1073 days	Thu 23/11/17	Fri 25/03/22	
125	Appel d'offres pour le recrutement des entreprises	128 days	Thu 23/11/17	Fri 01/06/18	
126	Travaux de conception	240 days	Wed 03/10/18	Thu 26/09/19	125FS+82 days
127	Construction des deux bâtiments du Dispatching	623 days	Fri 27/09/19	Fri 25/03/22	126
128	Projet "Accès à l'Electricité Hors-réseau"	1587 days	Fri 15/01/16	Mon 20/06/22	
129	Environnement propice au titre de l'Activité Electricité Hors-Réseau	567 days	Fri 15/01/16	Fri 04/05/18	
130	Lancement de la demande de Propositions	3 days	Fri 15/01/16	Wed 20/01/16	
131	Préparation, réception et ouverture des offres	49 days	Thu 21/01/16	Thu 31/03/16	130
132	Processus d'évaluation des offres/Propositions/Devis	126 days	Fri 01/04/16	Wed 05/10/16	131
133	Négociation et signature du contrat	25 days	Thu 06/10/16	Mon 14/11/16	132


Project: Plan de Travail des acti
Date: Tue 19/09/17

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
134	Livrables liés au Contrat	359 days	Tue 22/11/16	Fri 04/05/18	
135	Rapport de démarrage	80 days	Tue 22/11/16	Fri 17/03/17	133FS+5 days
136	Politique et Stratégie Nationales d'Electrification Hors-Réseau	204 days	Tue 22/11/16	Mon 18/09/17	133FS+5 days
137	Plan Directeur de l'Electrification Hors-Réseau (PD-EHR)	191 days	Tue 22/11/16	Wed 30/08/17	133FS+5 days
138	Cadre réglementaire de l'Electrification Hors-Réseau (CR-EHR)	207 days	Tue 22/11/16	Thu 21/09/17	133FS+5 days
139	Adoption par le Gouvernement, des documents de P&S-EHR, Plan Directeur (PD) et Cadre Reglementaire (CR) de l'EHR	144 days	Fri 04/08/17	Mon 05/03/18	133FS+178 days
140	Supports de formation des Agences de Mise en Œuvre	359 days	Tue 22/11/16	Fri 04/05/18	133FS+5 days
141	Activité "Facilité d'Energie Propre Hors-Réseau"	1454 days	Tue 02/08/16	Mon 20/06/22	
142	Lancement de la demande de Propositions	6 days	Tue 02/08/16	Tue 09/08/16	
143	Préparation, réception et ouverture des offres	55 days	Wed 10/08/16	Fri 28/10/16	142
144	Processus d'évaluation des offres/Propositions/Devis	71 days	Mon 31/10/16	Mon 13/02/17	143
145	Négociation et signature du contrat	36 days	Tue 14/02/17	Thu 06/04/17	144
146	Mise en oeuvre de l'OCEF	1281 days	Fri 14/04/17	Mon 20/06/22	145FS+5 days


Project: Plan de Travail des acti
Date: Tue 19/09/17


Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

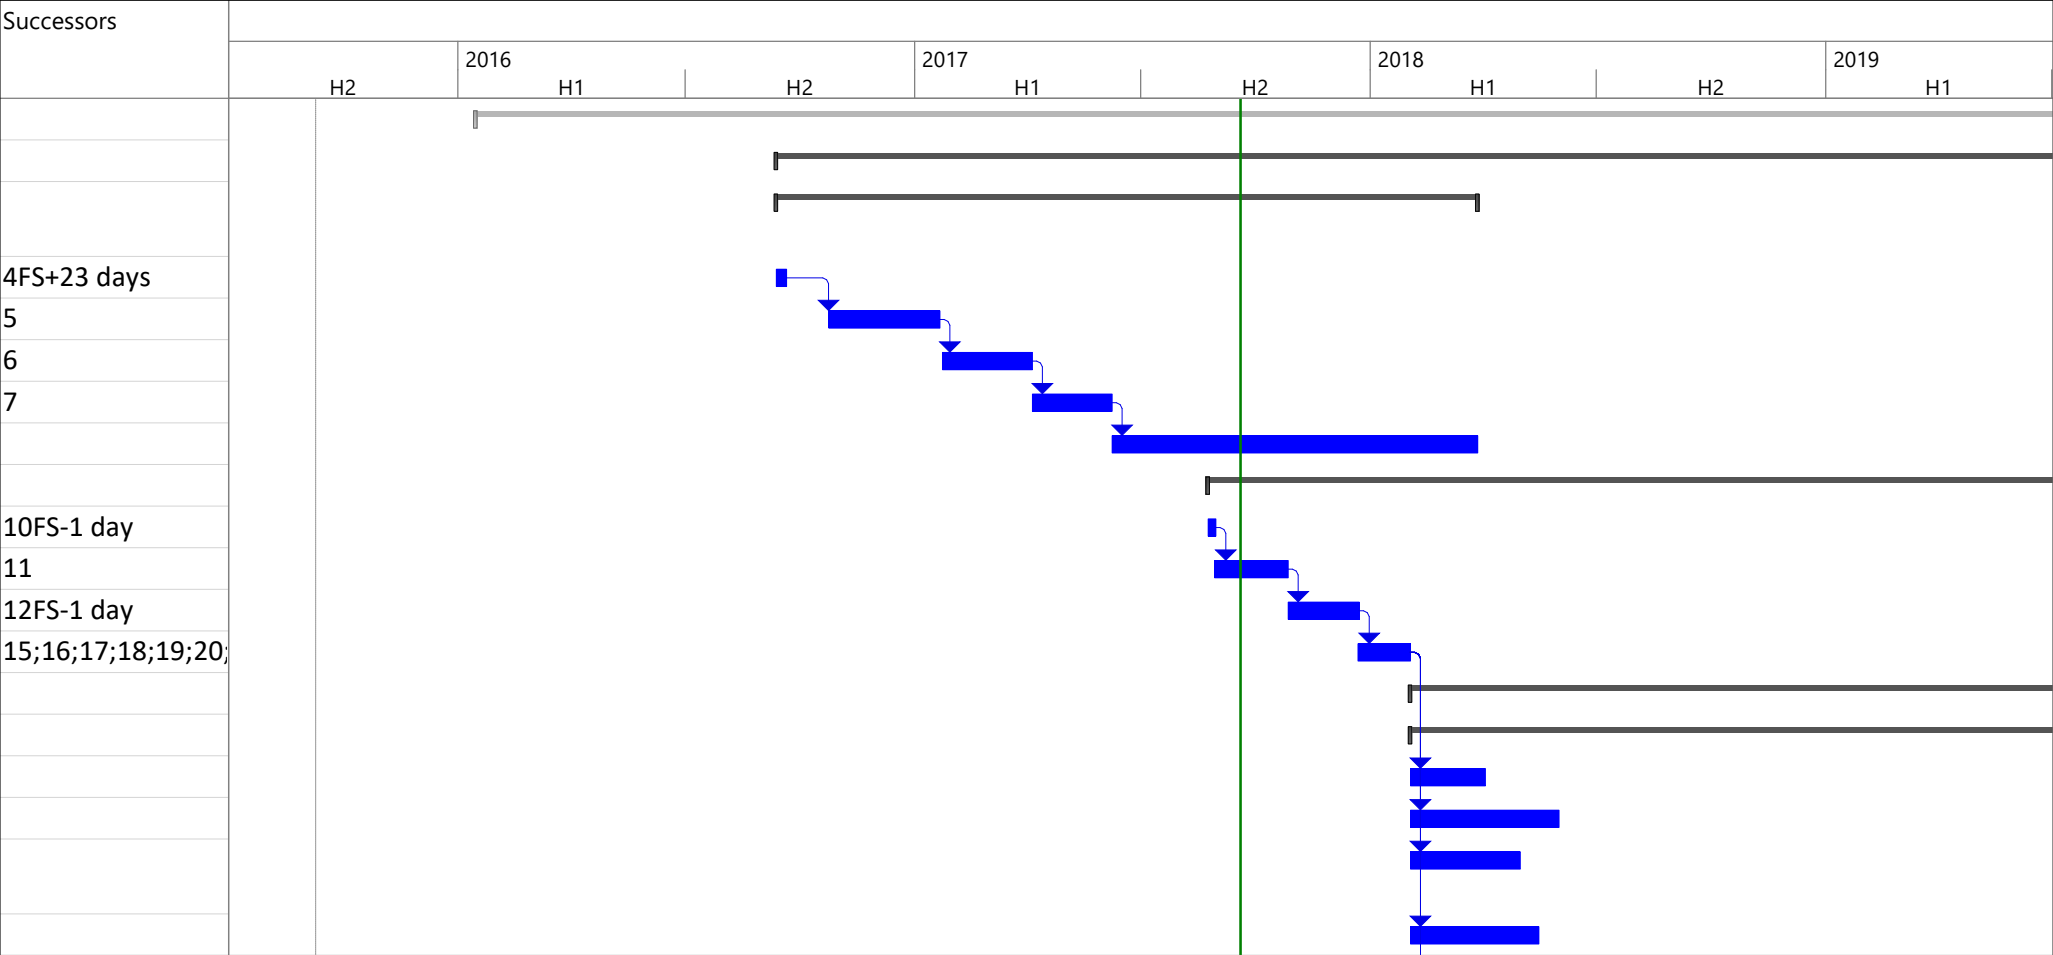


Project: Plan de Travail des acti Date: Tue 19/09/17	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

[illegible]

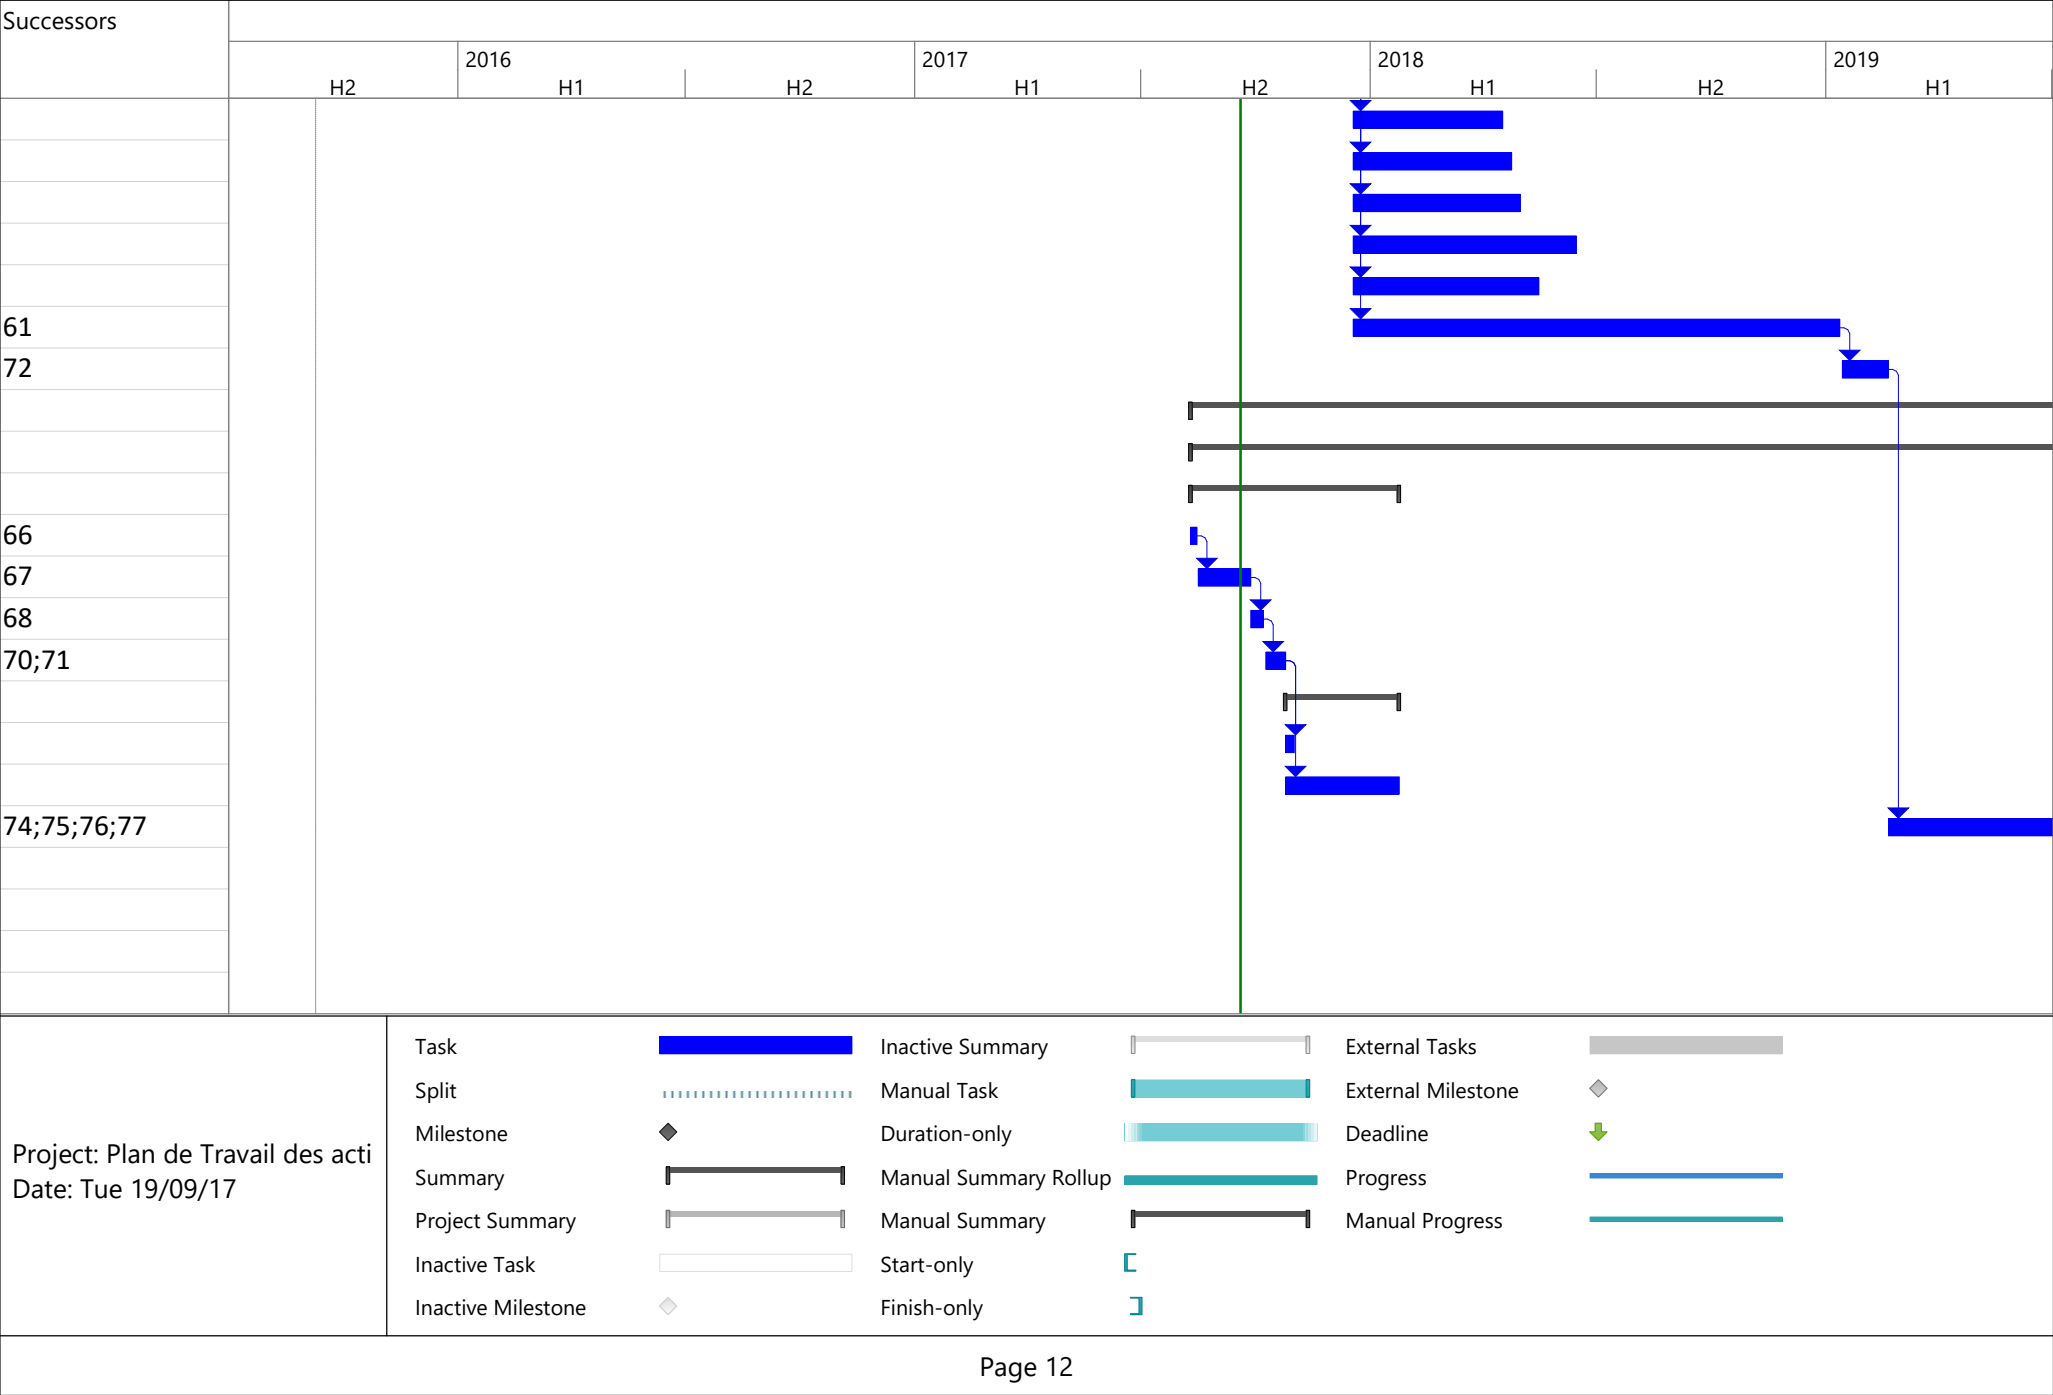


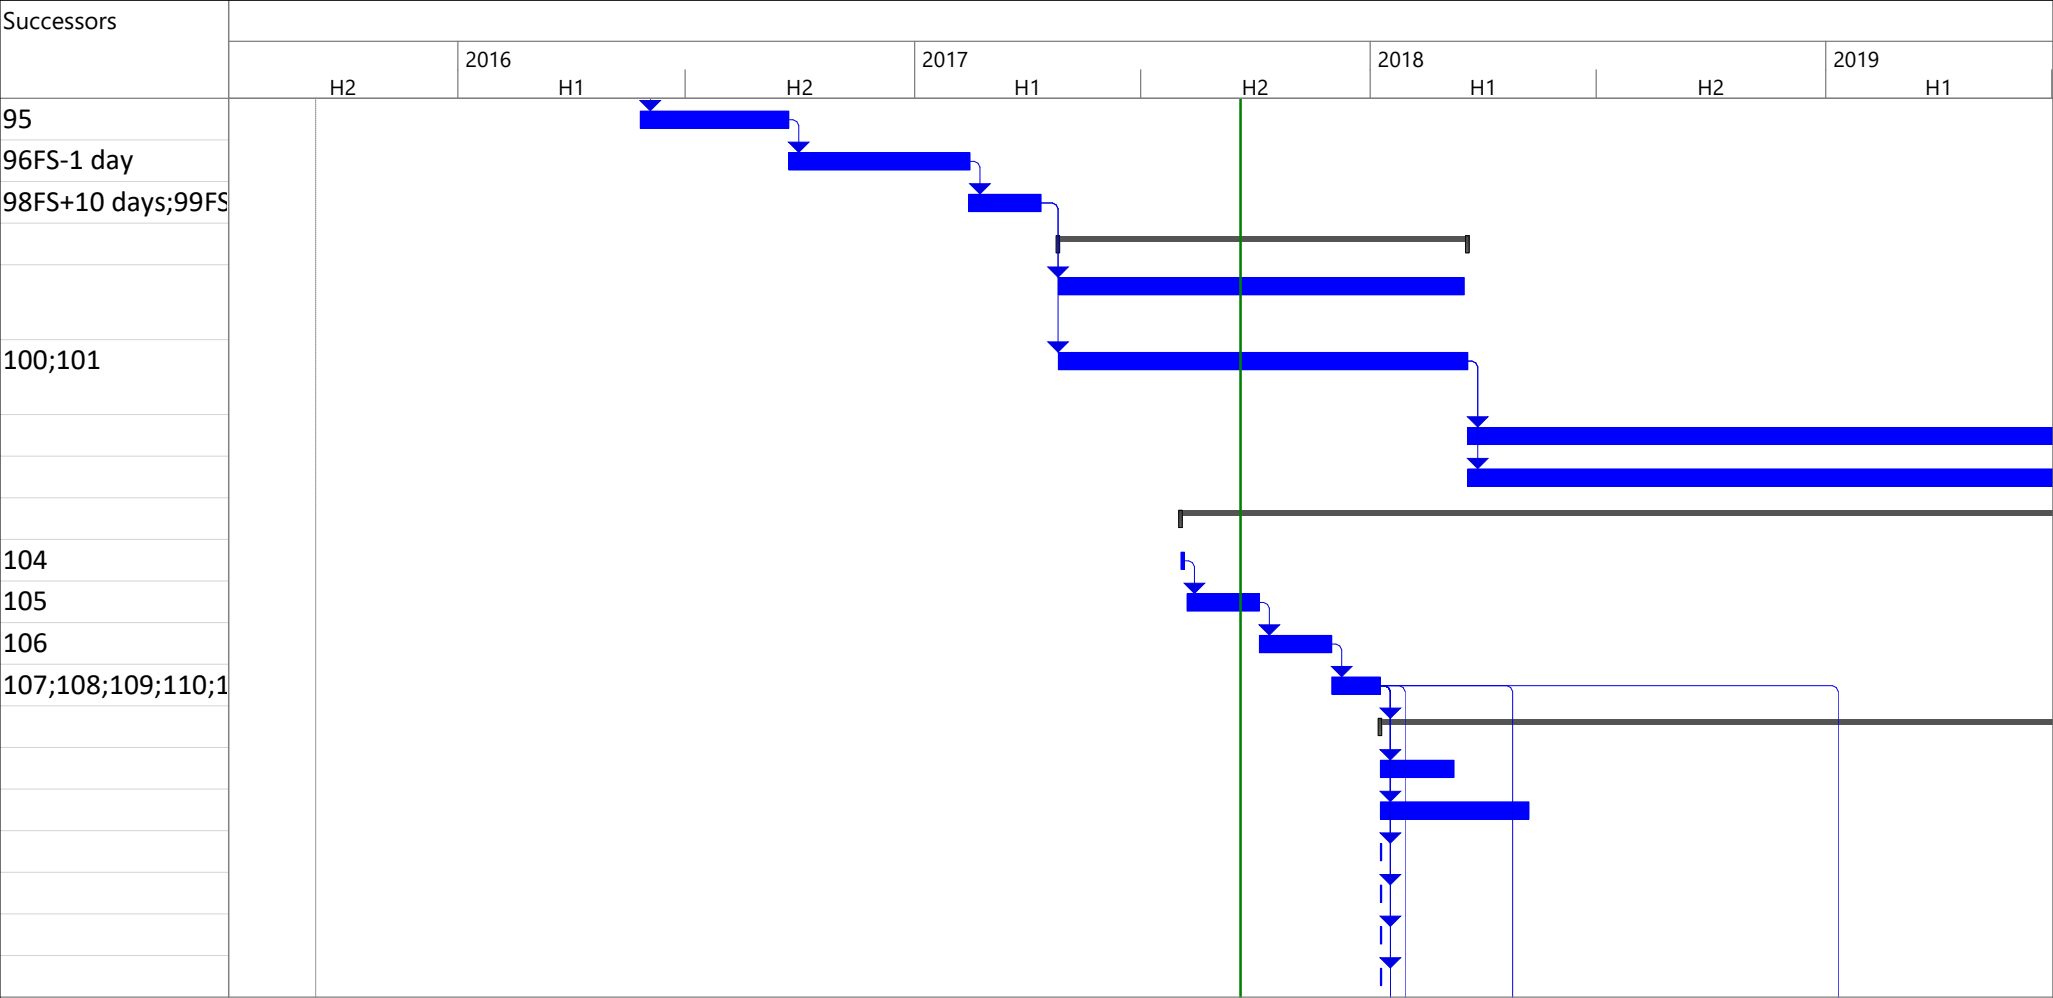

Project: Plan de Travail des acti Date: Tue 19/09/17	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

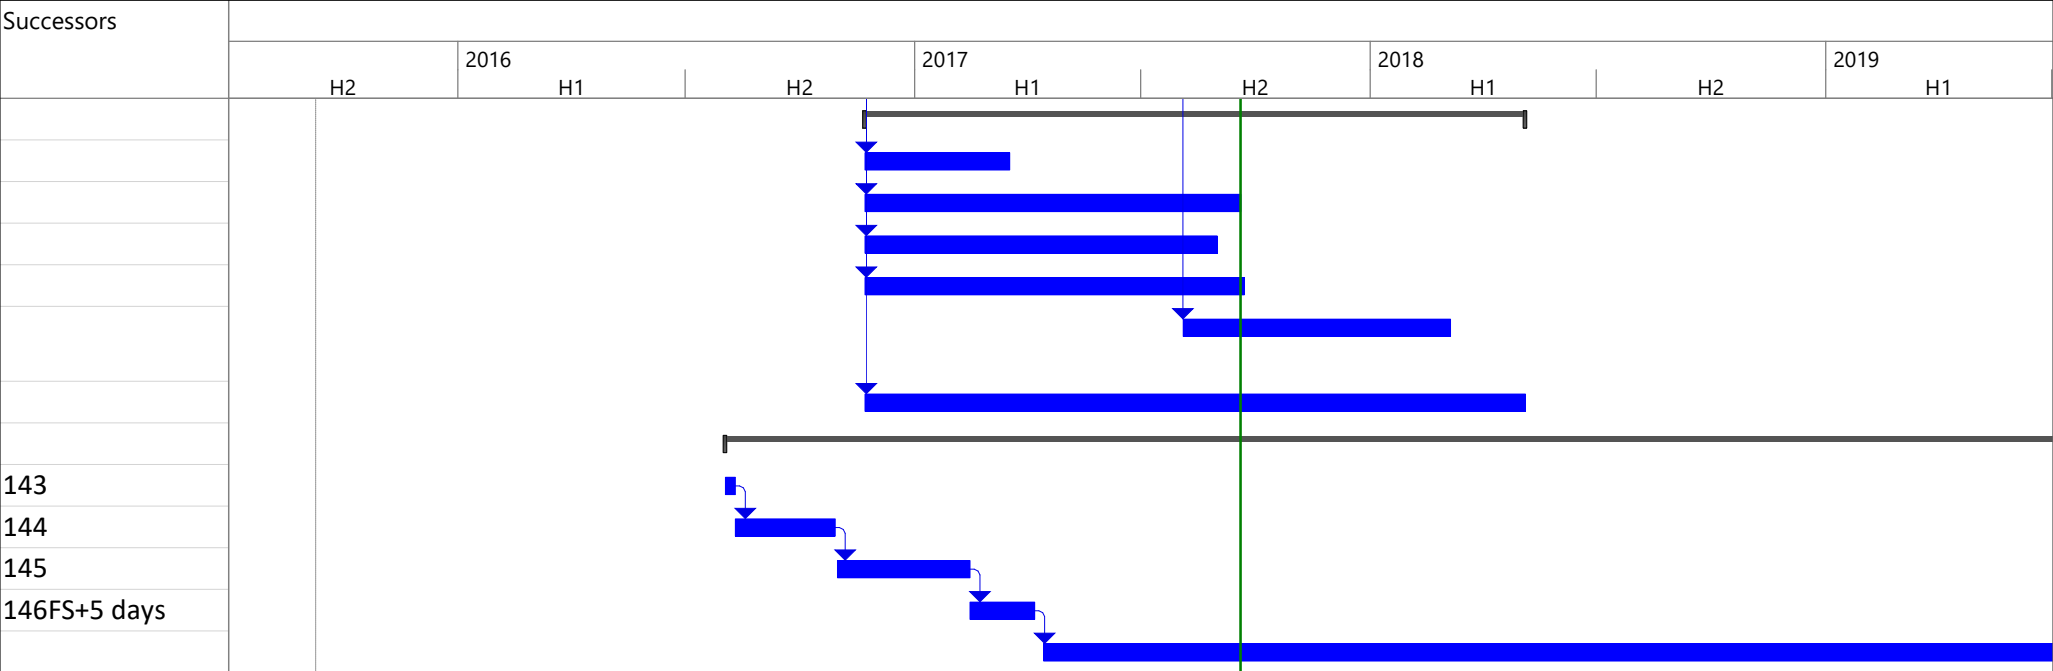


Project: Plan de Travail des acti Date: Tue 19/09/17	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

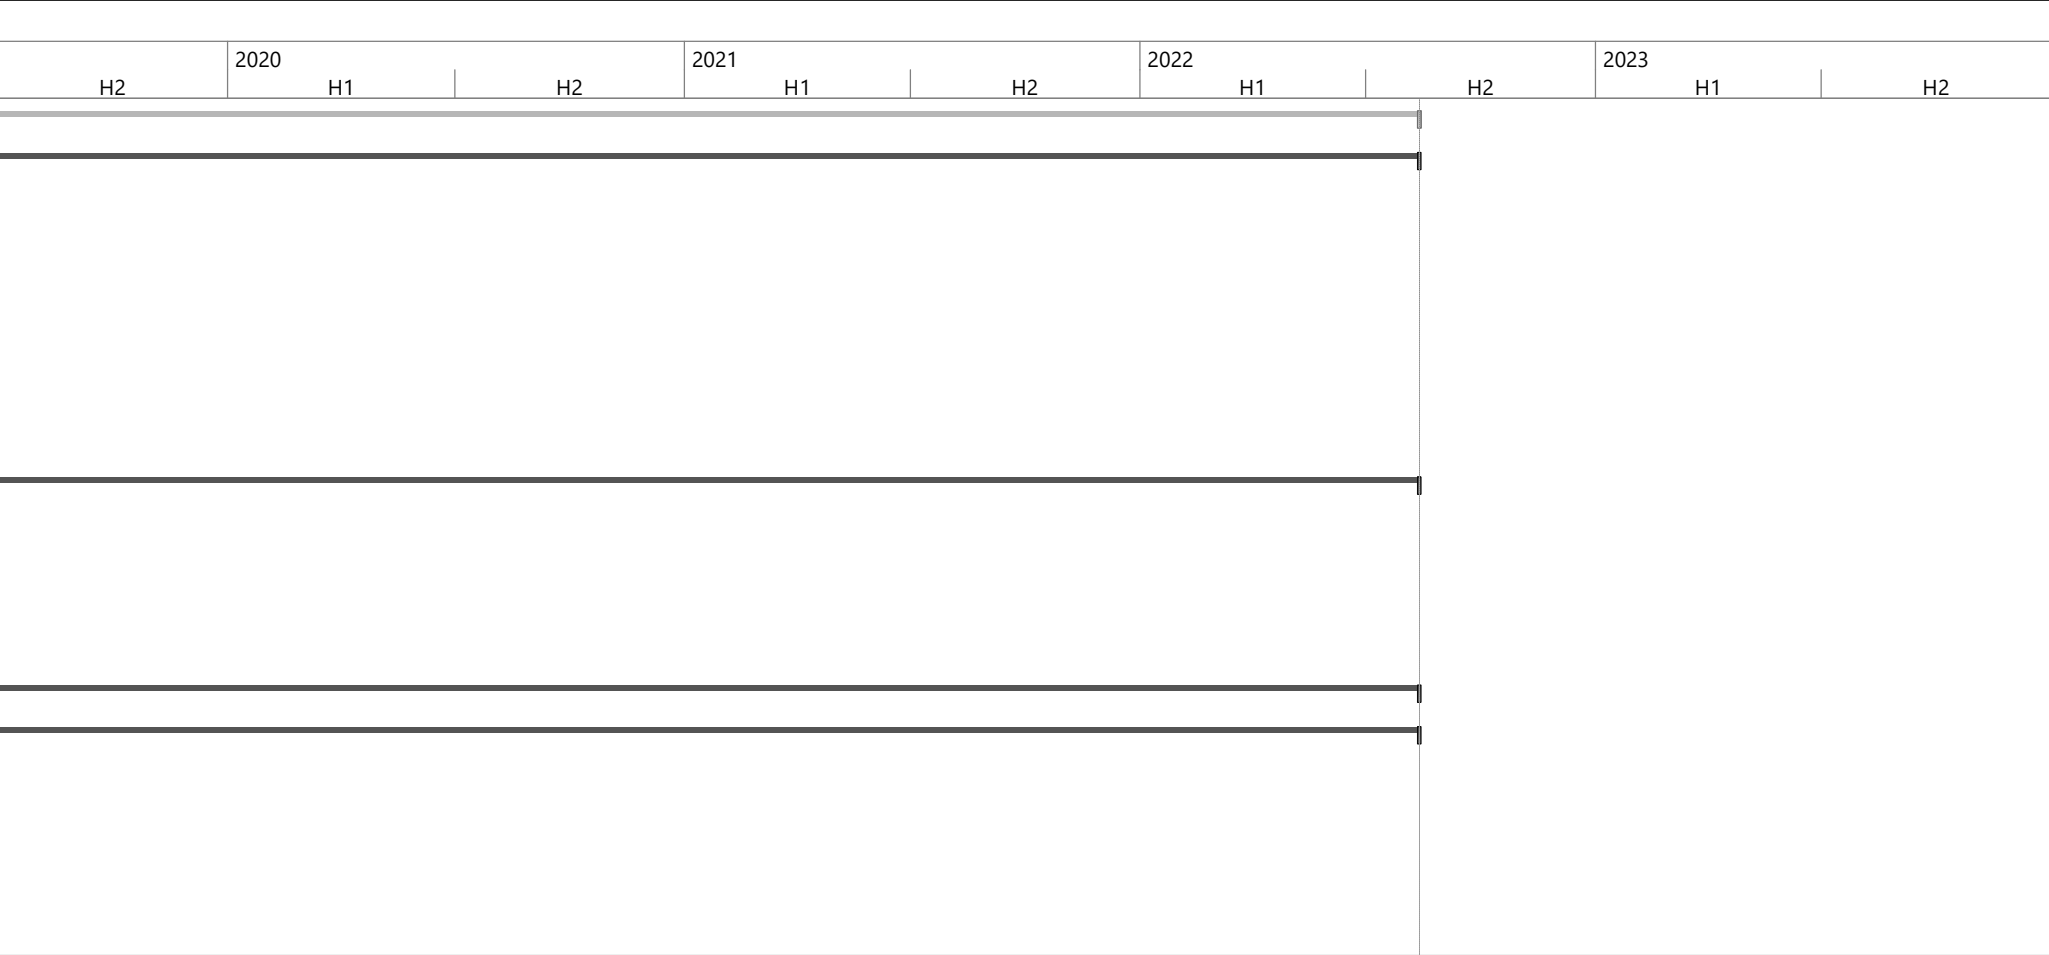

Project: Plan de Travail des acti Date: Tue 19/09/17	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

		2020		2021		2022		2023	
		H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
Project: Plan de Travail des acti Date: Tue 19/09/17		Task		Inactive Summary		External Tasks			
		Split		Manual Task		External Milestone			
		Milestone		Duration-only		Deadline			
		Summary		Manual Summary Rollup		Progress			
		Project Summary		Manual Summary		Manual Progress			
		Inactive Task		Start-only					
		Inactive Milestone		Finish-only					

H2		2020		H1		H2		2021		H1		H2		2022		H1		H2		2023		H1		H2	
Project: Plan de Travail des acti Date: Tue 19/09/17		Task		Inactive Summary		External Tasks																			
		Split		Manual Task		External Milestone																			
		Milestone		Duration-only		Deadline																			
		Summary		Manual Summary Rollup		Progress																			
		Project Summary		Manual Summary		Manual Progress																			
		Inactive Task		Start-only																					
		Inactive Milestone		Finish-only																					
Page 19																									

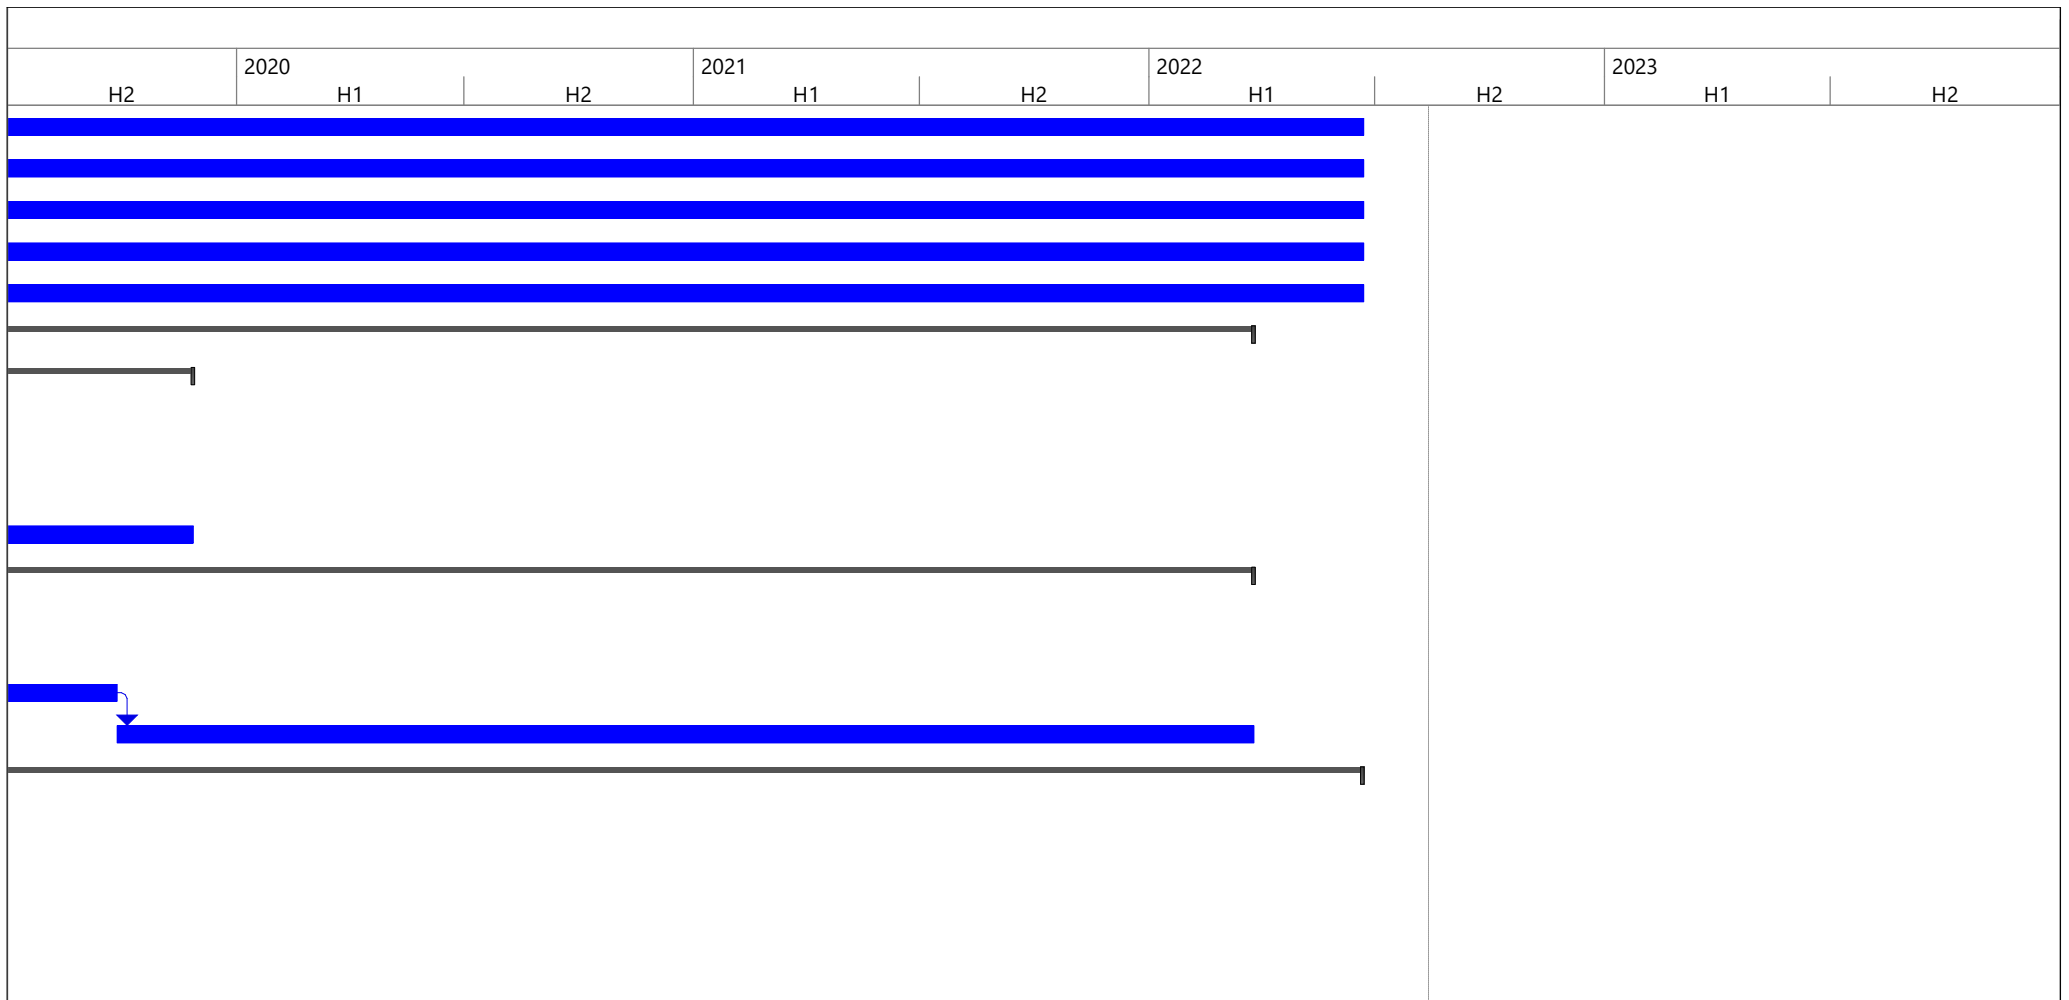

Project: Plan de Travail des acti Date: Tue 19/09/17	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

